

Datum prejema: 02.08.2023 09:37


neodgovorjeno označi kot odgovorjeno

je to mišljena začasna izvedba - prosim za objavo detajla:

1.2.27 "Izvedba prečnega prekopa ceste pri prečkanju s predvidenim vodovodom; bitumenski drobir BD pod asfaltom v deb. 30 cm, položitev PVC folije ali strešne lepenke z ravno zgornjo površino. Zabetoniranje nad slojem PVC ali strešne lepenke do višine obst. asfalta." m2 72,00

Gre za sanacijo prekopa asfaltne cestišča z betonsko stabilizacijo pred ponovnim asfaltiranjem. Detajl spodaj.

Sanacija prečnega prekopa asf. vozišča pri izgradnji vodovoda oz. el. NN. kablovoda oz. izpustno - prezračevalnega cevovoda

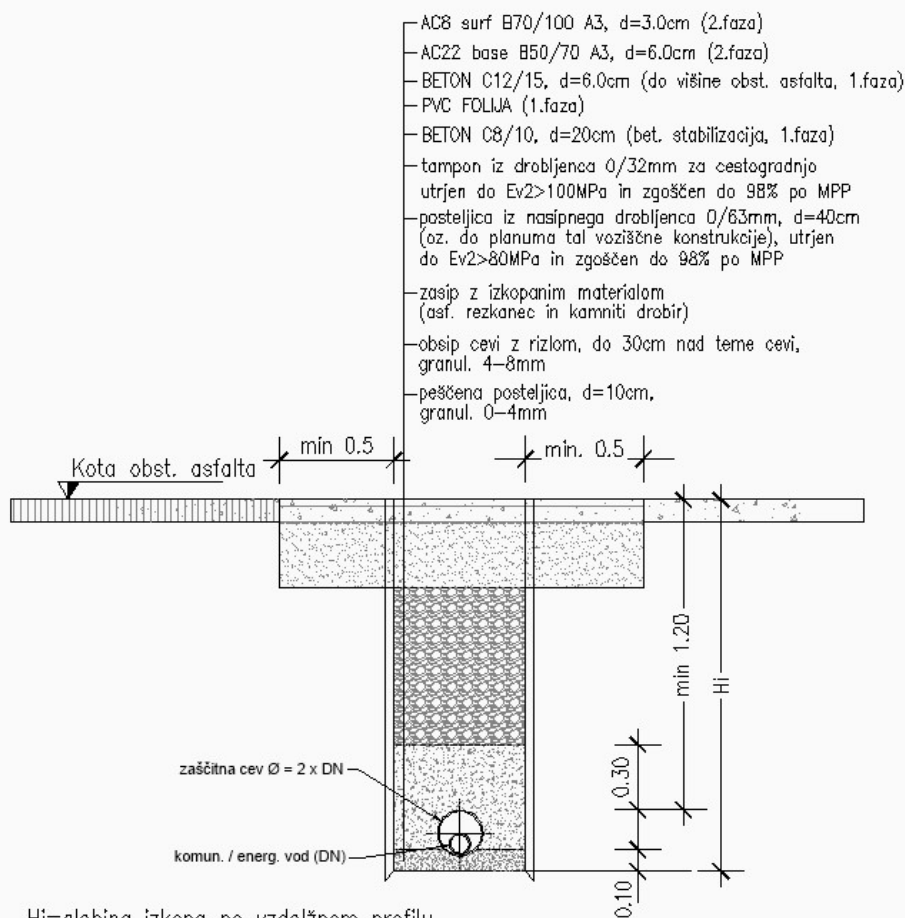

Datum prejema: 02.08.2023 11:41

neodgovorjeno označi kot odgovorjeno

OPREMA ZA MONITORING KVALITETE VODE - MERILNIK REZIDUALNEGA KLORA

1.4.128 Merilnik rezidualnega klora za vgradnjo v vodovodni jašek, v kompletu z vsemi zapornimi elementi, protipovratnim ventilom, montažnim in tesnilnim materialom in izdelavo iztoka v bližnjo kanalizacijsko cev oz. jašek. kpl 1,00

se lahko objavi načrt, detajl - montažna shema?

Na spodnji sliki primer, ko analizator vrača analizirano vodo v cevovod. Natančnejše montažne sheme oz. načrte se pridobi od dobaviteljev proizvoda.

